


# 実装タイムライン図


作成日: 2026-05-23

用途: MTG資料（印刷用ペラ1枚）

## 実装順序（ガントチャート風）

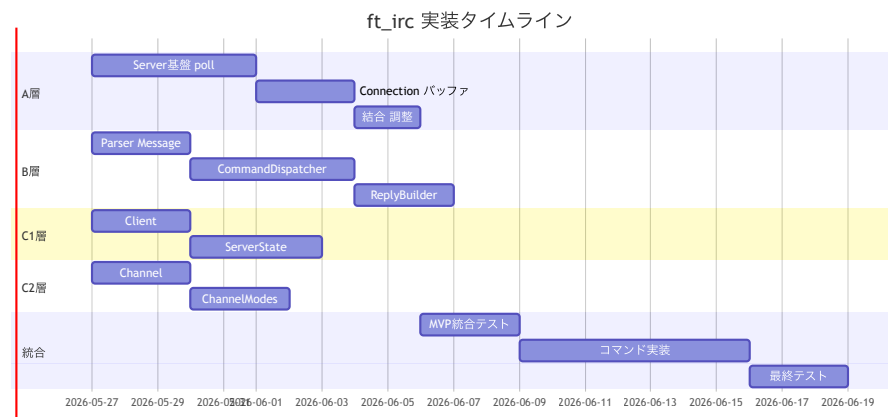


## フェーズ別作業



## 並行作業マトリクス

| Phase | torinoue (A+B)         | taro (C1)   | hanako (C2)  | 並行可能？         |
|-------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 1     | Server基盤, Parser       | Client      | Channel      | ✅ 全員並行        |
| 2     | Connection, Dispatcher | ServerState | ChannelModes | ✅ 全員並行        |
| 3     | 結合・調整                  | レビュー        | レビュー         | ⚠️ torinoue主導 |
| 4     | コマンド実装                 | テスト支援       | テスト支援        | ⚠️ torinoue主導 |


クリティカルパス (PDM図)

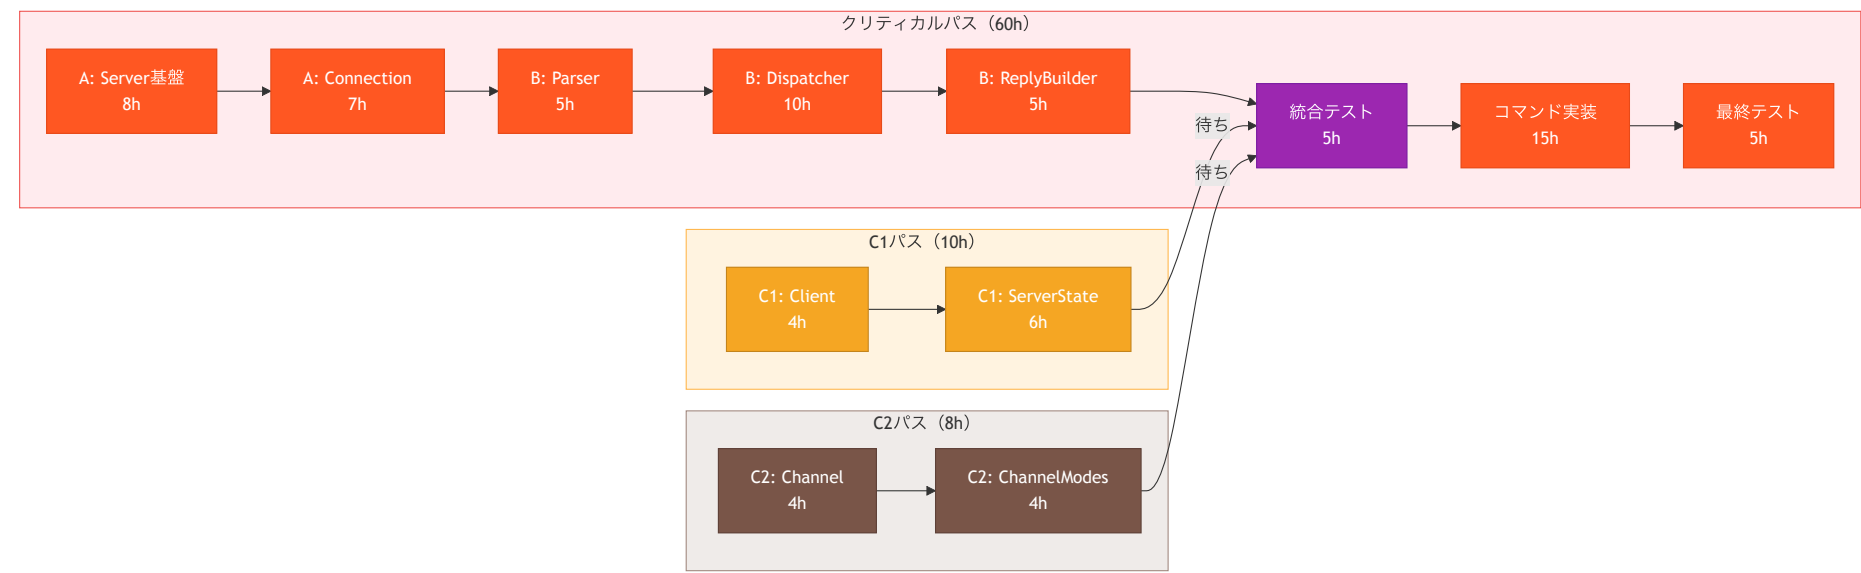

パス別工数

| パス     | タスク              | 工数  | 累計  |
|--------|------------------|-----|-----|
| クリティカル | A: Server基盤      | 8h  | 8h  |
|        | A: Connection    | 7h  | 15h |
|        | B: Parser        | 5h  | 20h |
|        | B: Dispatcher    | 10h | 30h |
|        | B: ReplyBuilder  | 5h  | 35h |
|        | 統合テスト            | 5h  | 40h |
|        | コマンド実装           | 15h | 55h |
|        | 最終テスト            | 5h  | 60h |
| C1パス   | C1: Client       | 4h  | 4h  |
|        | C1: ServerState  | 6h  | 10h |
| C2パス   | C2: Channel      | 4h  | 4h  |
|        | C2: ChannelModes | 4h  | 8h  |

統合ポイントと待ち関係

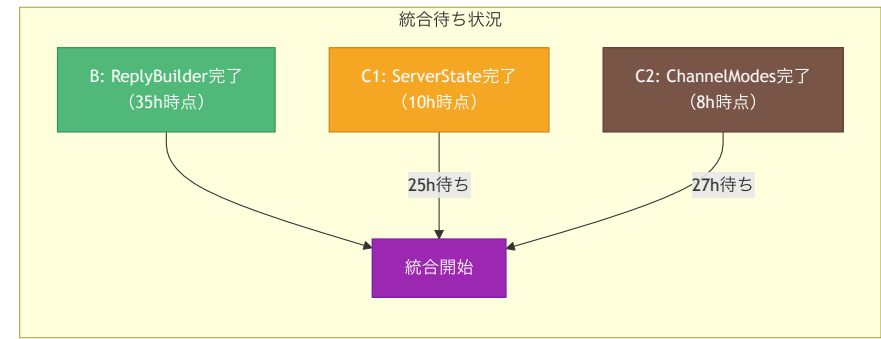

結論:

- C1/C2は**早期完了**するが、B層完了まで統合待ち
- C1/C2担当者は待ち時間に**レビュー・テスト支援**に回れる
- **ボトルネック: torinoue (A+B)** — この遅延が全体に直結

リスクと対策

| リスク         | 影響       | 対策                   |
|-------------|----------|----------------------|
| A+B担当の過負荷   | 全体遅延     | C1/C2からのレビュー・テスト支援   |
| インターフェース不一致 | 統合時の手戻り  | 早期にinterface.md確認・合意 |
| RFC理解不足     | コマンド仕様誤り | クイズ・チェックリストで確認       |

色凡例

| 色      | HEX     | 意味            |
|--------|---------|---------------|
| ● 赤    | #FF5722 | クリティカルパス上のタスク |
| ● オレンジ | #F5A623 | C1層作業（並行パス）   |
| ● 茶    | #795548 | C2層作業（並行パス）   |
| ● 紫    | #9C27B0 | 統合ポイント        |
| ● 緑    | #50B878 | B層完了マイルストーン   |
