



【開発】実装タイムライン図

作成日: 2026-05-23
用途: MTG資料（印刷用ペラ1枚）

実装順序（ガントチャート風）

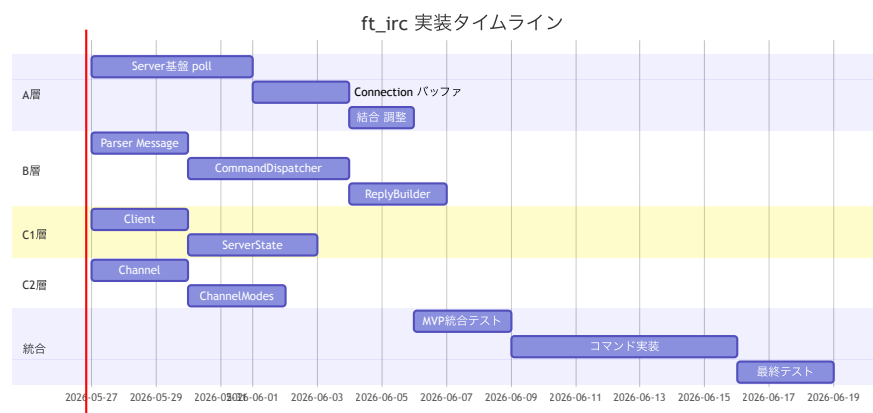


【開発】フェーズ別作業



並行作業マトリクス

Phase	torinoue (A+B)	taro (C1)	hanako (C2)	並行可能？
1	Server基盤, Parser	Client	Channel	✅ 全員並行
2	Connection, Dispatcher	ServerState	ChannelModes	✅ 全員並行
3	結合・調整	レビュー	レビュー	⚠️ torinoue主導
4	コマンド実装	テスト支援	テスト支援	⚠️ torinoue主導


【開発】クリティカルパス（PDM図）

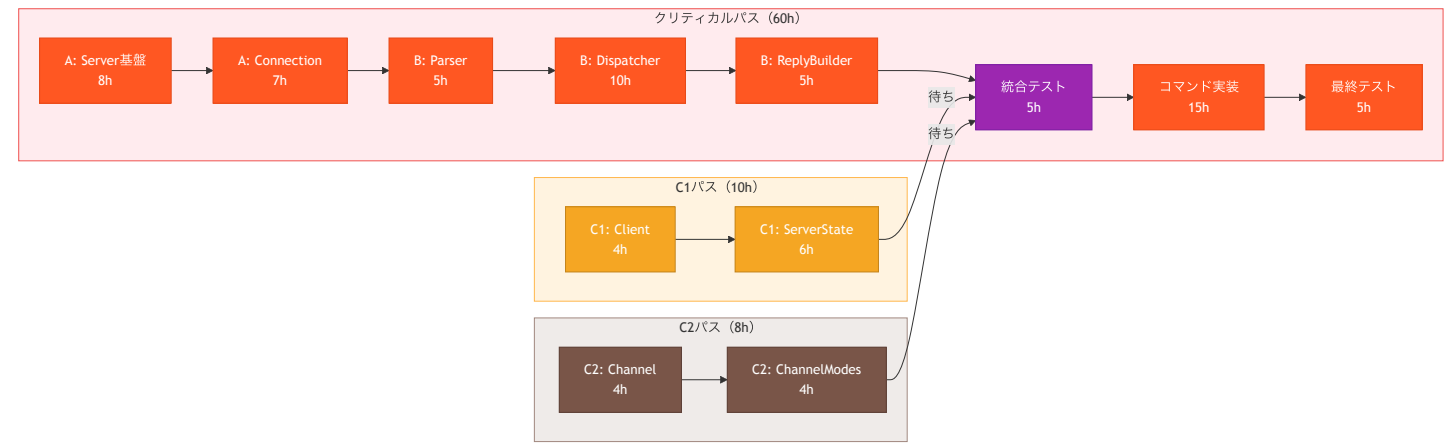

パス別工数

パス	タスク	工数	累計
クリティカル	A: Server基盤	8h	8h
	A: Connection	7h	15h
	B: Parser	5h	20h
	B: Dispatcher	10h	30h
	B: ReplyBuilder	5h	35h
	統合テスト	5h	40h
	コマンド実装	15h	55h
	最終テスト	5h	60h
C1パス	C1: Client	4h	4h
	C1: ServerState	6h	10h
C2パス	C2: Channel	4h	4h
	C2: ChannelModes	4h	8h

統合ポイントと待ち関係

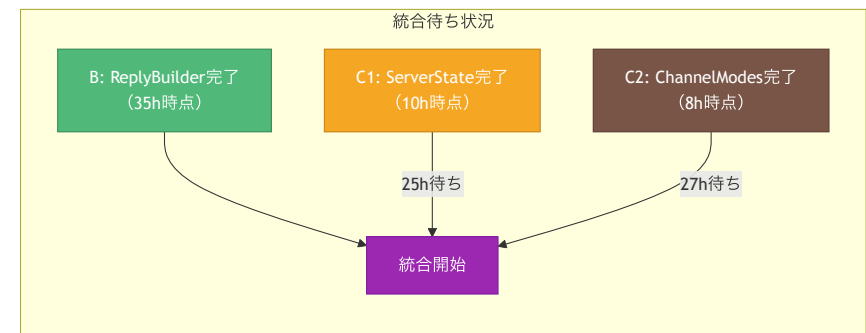

結論:

- C1/C2は早期完了するが、B層完了まで統合待ち
- C1/C2担当者は待ち時間にレビュー・テスト支援に回れる
- ボトルネック: torinoue (A+B) — この遅延が全体に直結

リスクと対策

リスク	影響	対策
A+B担当の過負荷	全体遅延	C1/C2からのレビュー・テスト支援
インターフェース不一致	統合時の手戻り	早期にinterface.md確認・合意
RFC理解不足	コマンド仕様誤り	クイズ・チェックリストで確認

色凡例

色	HEX	意味
● 赤	#FF5722	クリティカルパス上のタスク
● オレンジ	#F5A623	C1層作業（並行パス）
● 茶	#795548	C2層作業（並行パス）
● 紫	#9C27B0	統合ポイント
● 緑	#50B878	B層完了マイルストーン
